東北大学（星陵）ライフサイエンスラボ新営その他工事

2025年10月工程表

作成日	日本住宅株式会社	建築		電気設備		機械設備	
		現場代理人	監理技術者	現場代理人	監理技術者	現場代理人	監理技術者
2025年9月17日		内海	佐藤	江口	千木良	渡辺	荒井

工事種別	9月	10月	11月
仮設工事	仮設スロープ作成・敷鉄板 建物位置出・H鋼位置出 山留 湧き水井戸掘削	スロープ・敷鉄板整備 墨出 地足場 墨出	
解体工事	残解体物撤去 ・貯留槽4,A		
土工事 A工区 B工区 C工区	根切(1018㎥)	根切(1077㎥) 止枠 捨コン 根切(815㎥) 止枠 捨コン・ラップルコン	
鉄筋工事 A工区 B工区 C工区		基礎地中梁配筋 基礎地中梁配筋 基礎地中梁配筋	
搬出入 揚重機		型枠 コン 足場 コン 鉄筋 型枠 25t 25t 鉄筋 25t	
電気設備工事	現場事務所内作業・施工図作成他	大地抵抗率測定・接地極埋設 接地極配管立上	
機械設備工事	水道・下水道申請協議 事務所内作業 事務所内作業	共同溝内給水配管準備 事務所内作業 事務所内作業	事務所内作業 各所墨出し・雑工
振動	●●● ●●●	◎◎◎◎◎ ○○○○○ ◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎	◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎
騒音	◎◎◎ ●●●	◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎● ◎◎◎●◎	◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎ ◎◎
工事車両	■■■ ■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■▲ ■■■▲■	■ ■
月間安全目標	熱中症災害の防止・重機災害の防止・墜落・転落災害の防止	重機災害の防止・墜落・転落災害の防止・第3者災害の防止	保護具着用の徹底・クレーン災害の防止・脚立,立馬使用時の災害防止
安全当番(業者)	柴崎総業	東信空調 / ジーエル / 東信空調 / フォーユーサポート	東信空調 / サンエーテック / 東信空調
安全当番(NJ)	日本住宅 田中	日本住宅 大薗 / 日本住宅 田中 / 日本住宅 佐藤 / 日本住宅 青木	日本住宅 田中 / 日本住宅 大薗 / 日本住宅 佐藤
行事予定	定例会議 全休日	災害防止協議会 全休日 全休日 全休日 全休日 / 定例会議 全休日 全休日 / 全休日 全休日 / 全休日 定例会議 全休日	全休日 全休日 / 災害防止協議会 定例会議 全休日 全休日 / 全休日 全休日

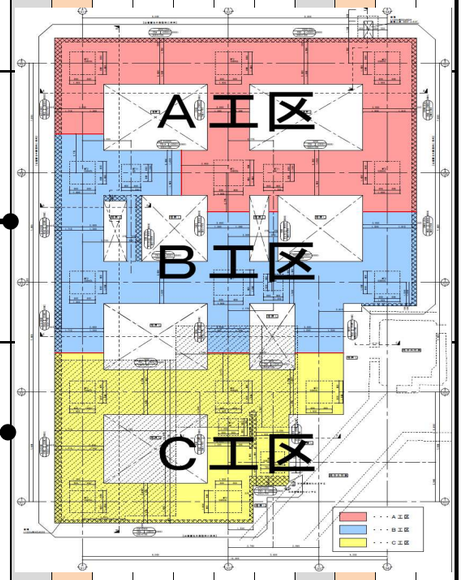

振動・騒音（凡例）：●(大)　◎(中)　○(小)　車両（凡例）■(大型)　□(中型)　★(クレーン)　▲(生コン)
